




Situazione esistente

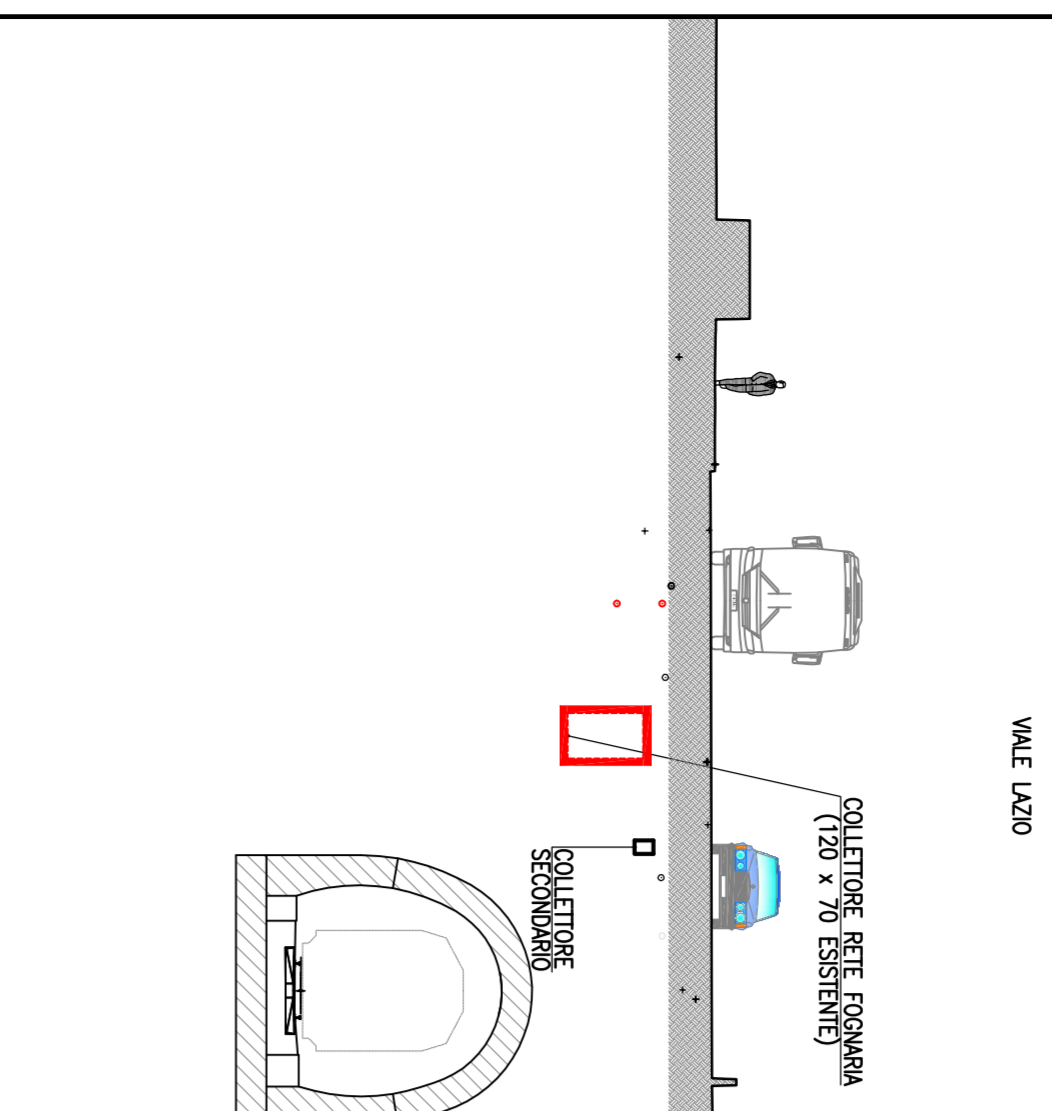


- FASE 1:**
- a) Blindatura galleria rinchiodabile;
 - b) Chiusura del traffico veicolare;
 - c) Fresco per una profondità di circa 1,20m circa;
 - d) Risoluzione interferenze dei sottoservizi;
 - e) Realizzazione del pali Ø920/accostati;
 - f) Posizionamento nuovo collettore fognaio;
 - g) Dimissione del collettore fognaio esistente;

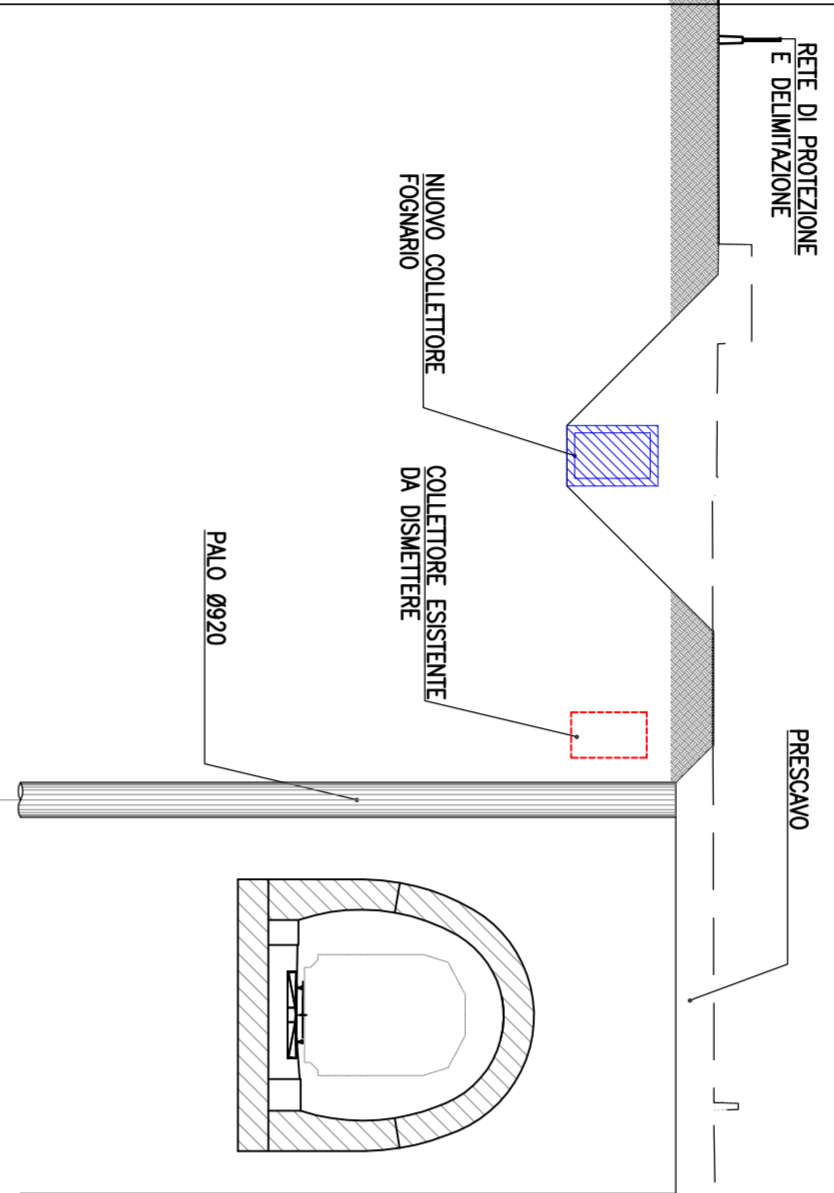


- FASE 2:**
- a) Esecuzione dello scavo di ribasso fino a quota solettone superiore;
 - b) Scavo ulteriore di 20cm e realizzazione del mostrone;
 - c) Posa in opera di lastre in fibre vegetali dello spessore di 15mm;

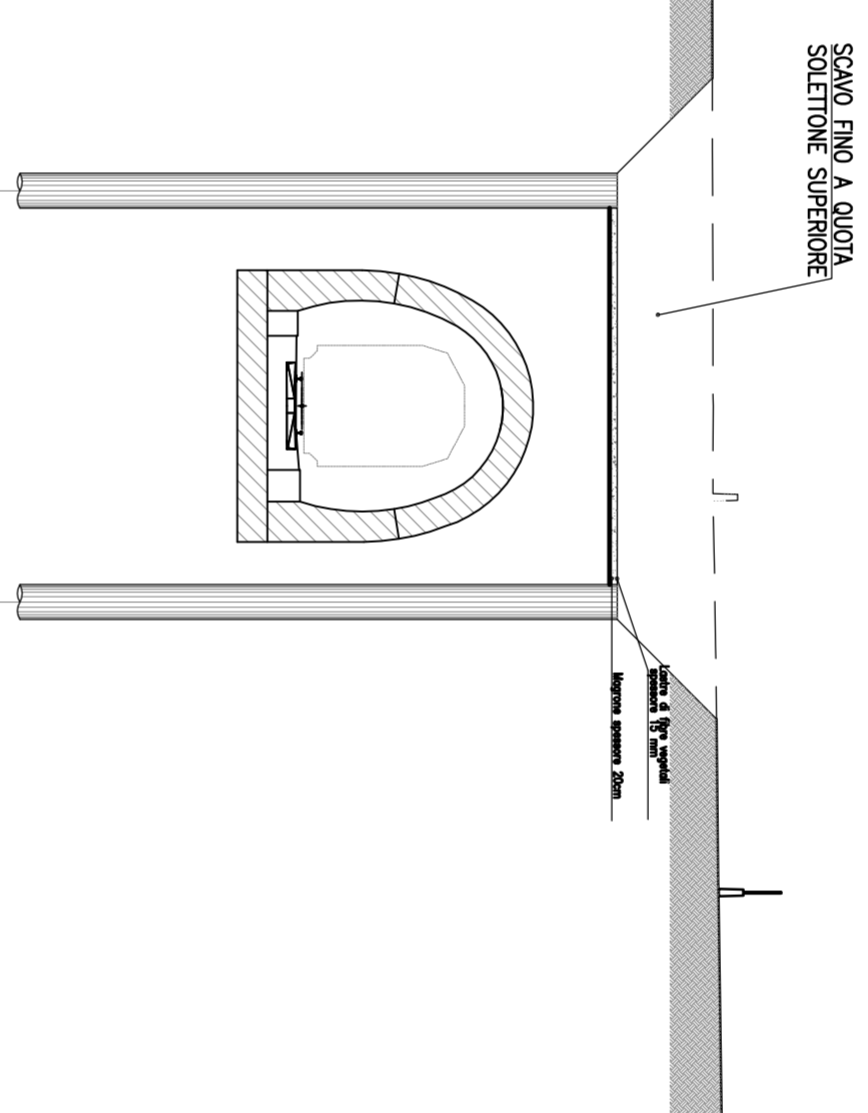


- FASE 3:**
- a) Realizzazione del solettone di copertura;
 - b) Posa in opera rilevato stradale e ripristino dei sottoservizi e della visibilità stradale;

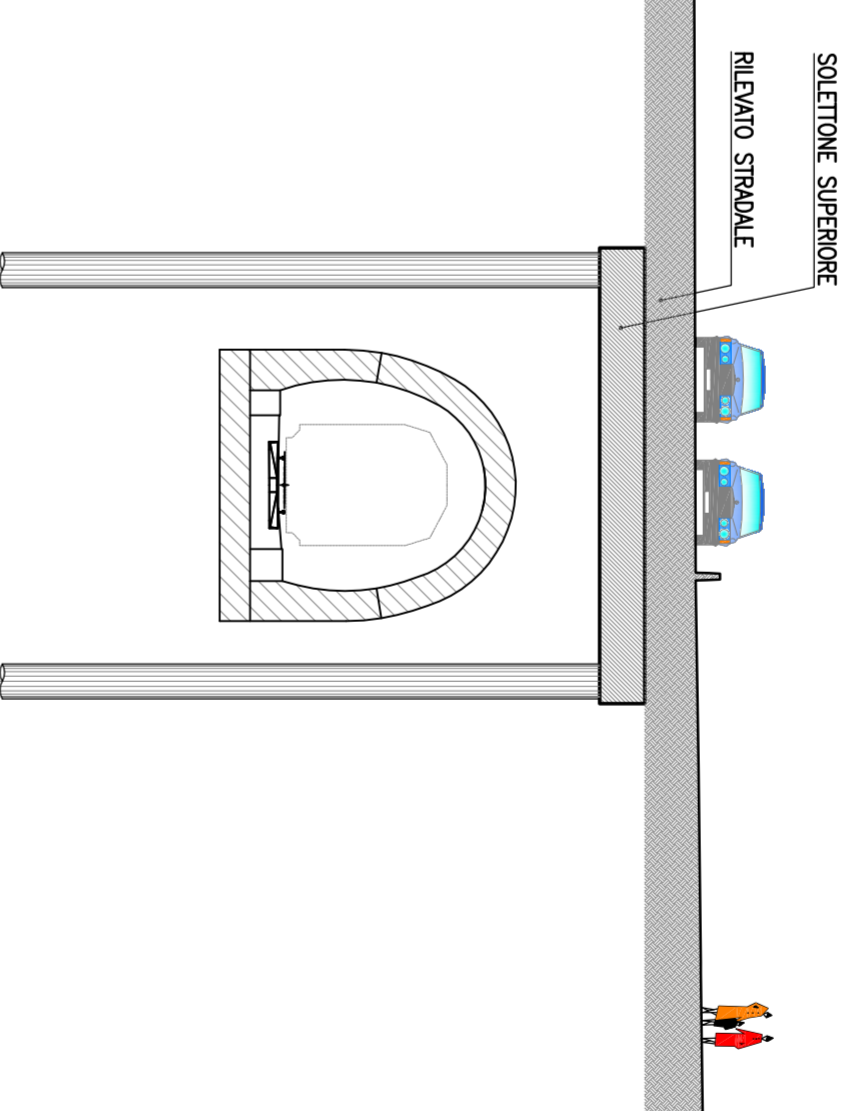


- FASE 4:**
- a) Demolizione galleria esistente;
 - b) Scavo a foro cieco;
 - c) Realizzazione del solettone di base, impermeabilizzazione e realizzazione delle contropareti;

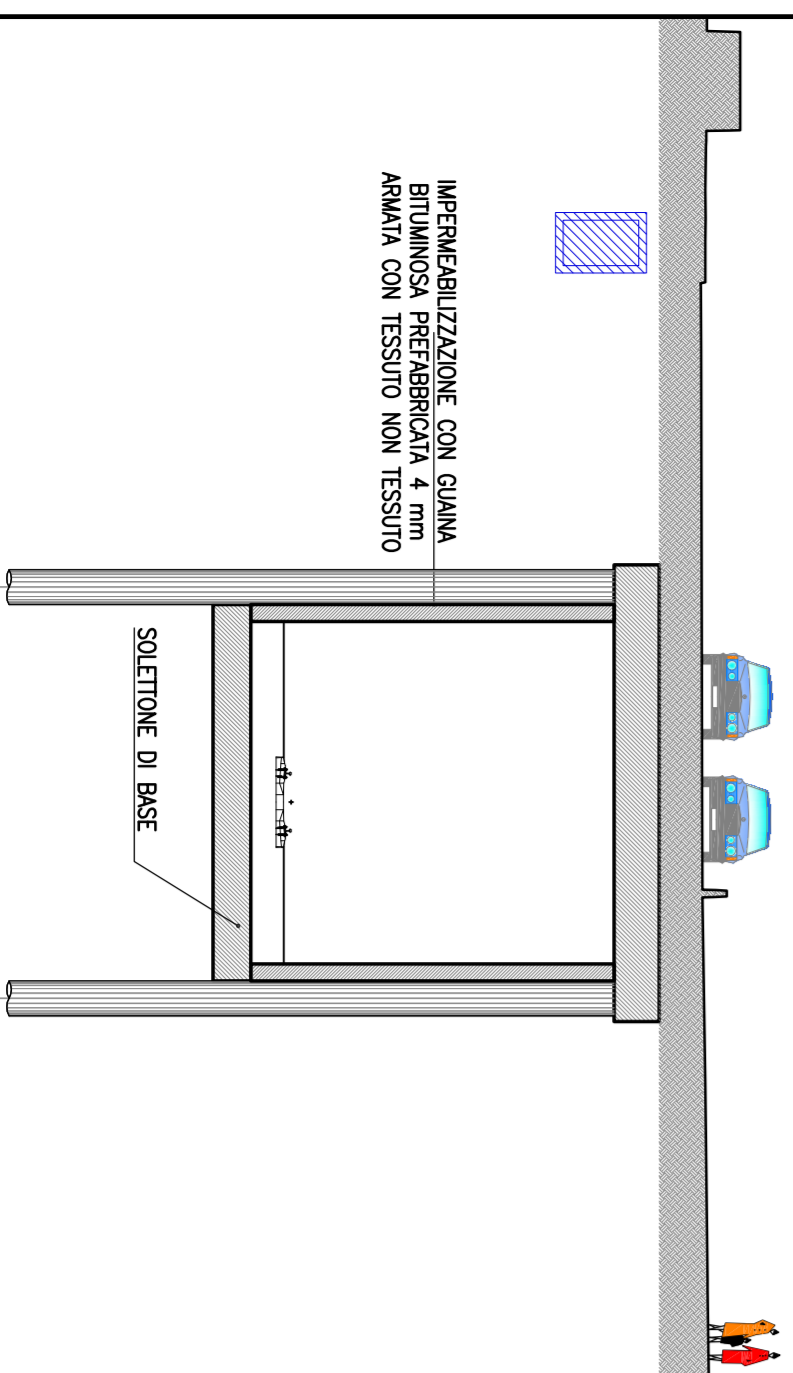

- FASE 5:**
- a) Esecuzione delle banchine e delle opere di finitura;

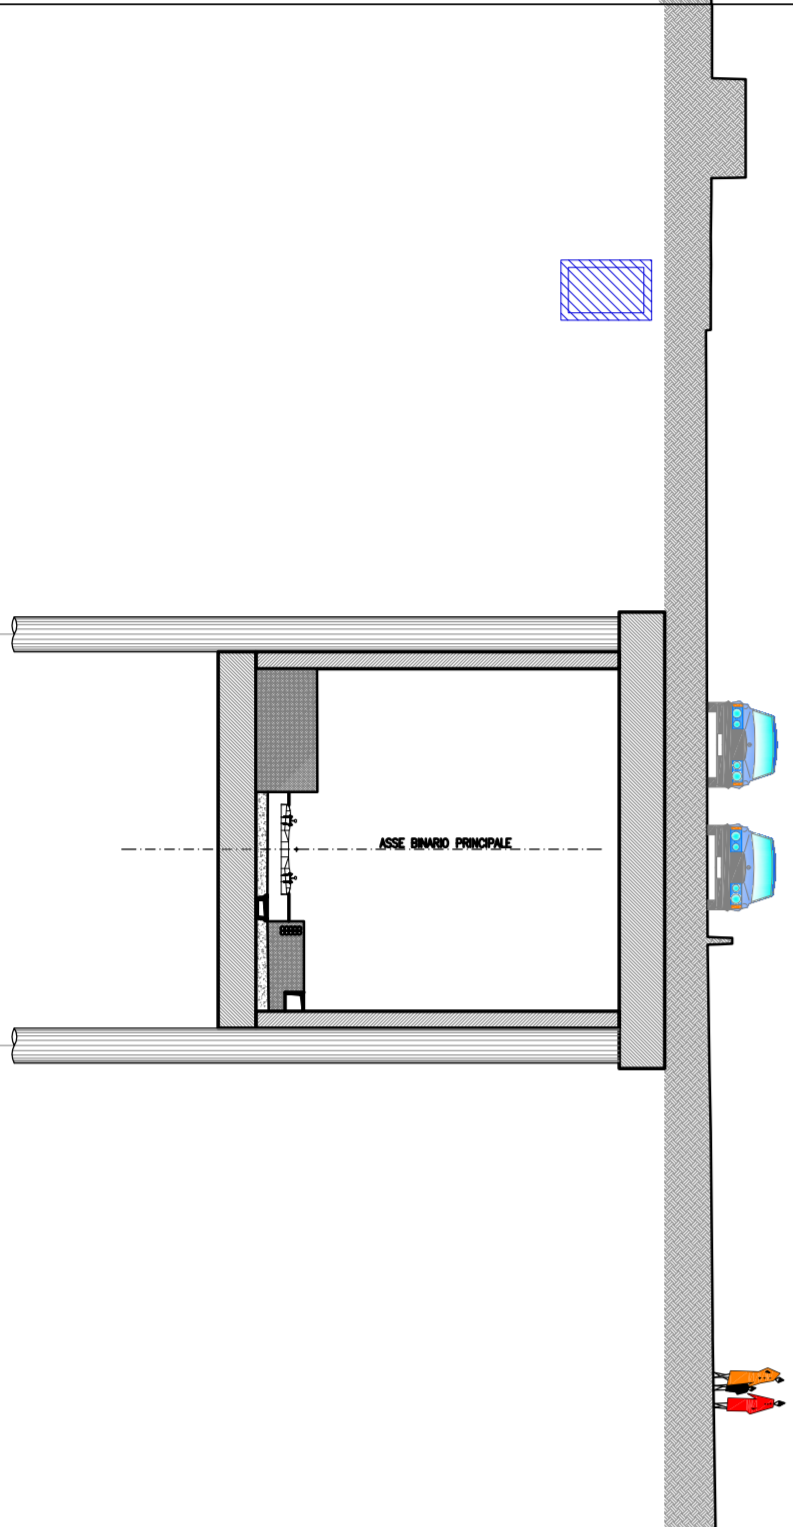

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
scala 1:500

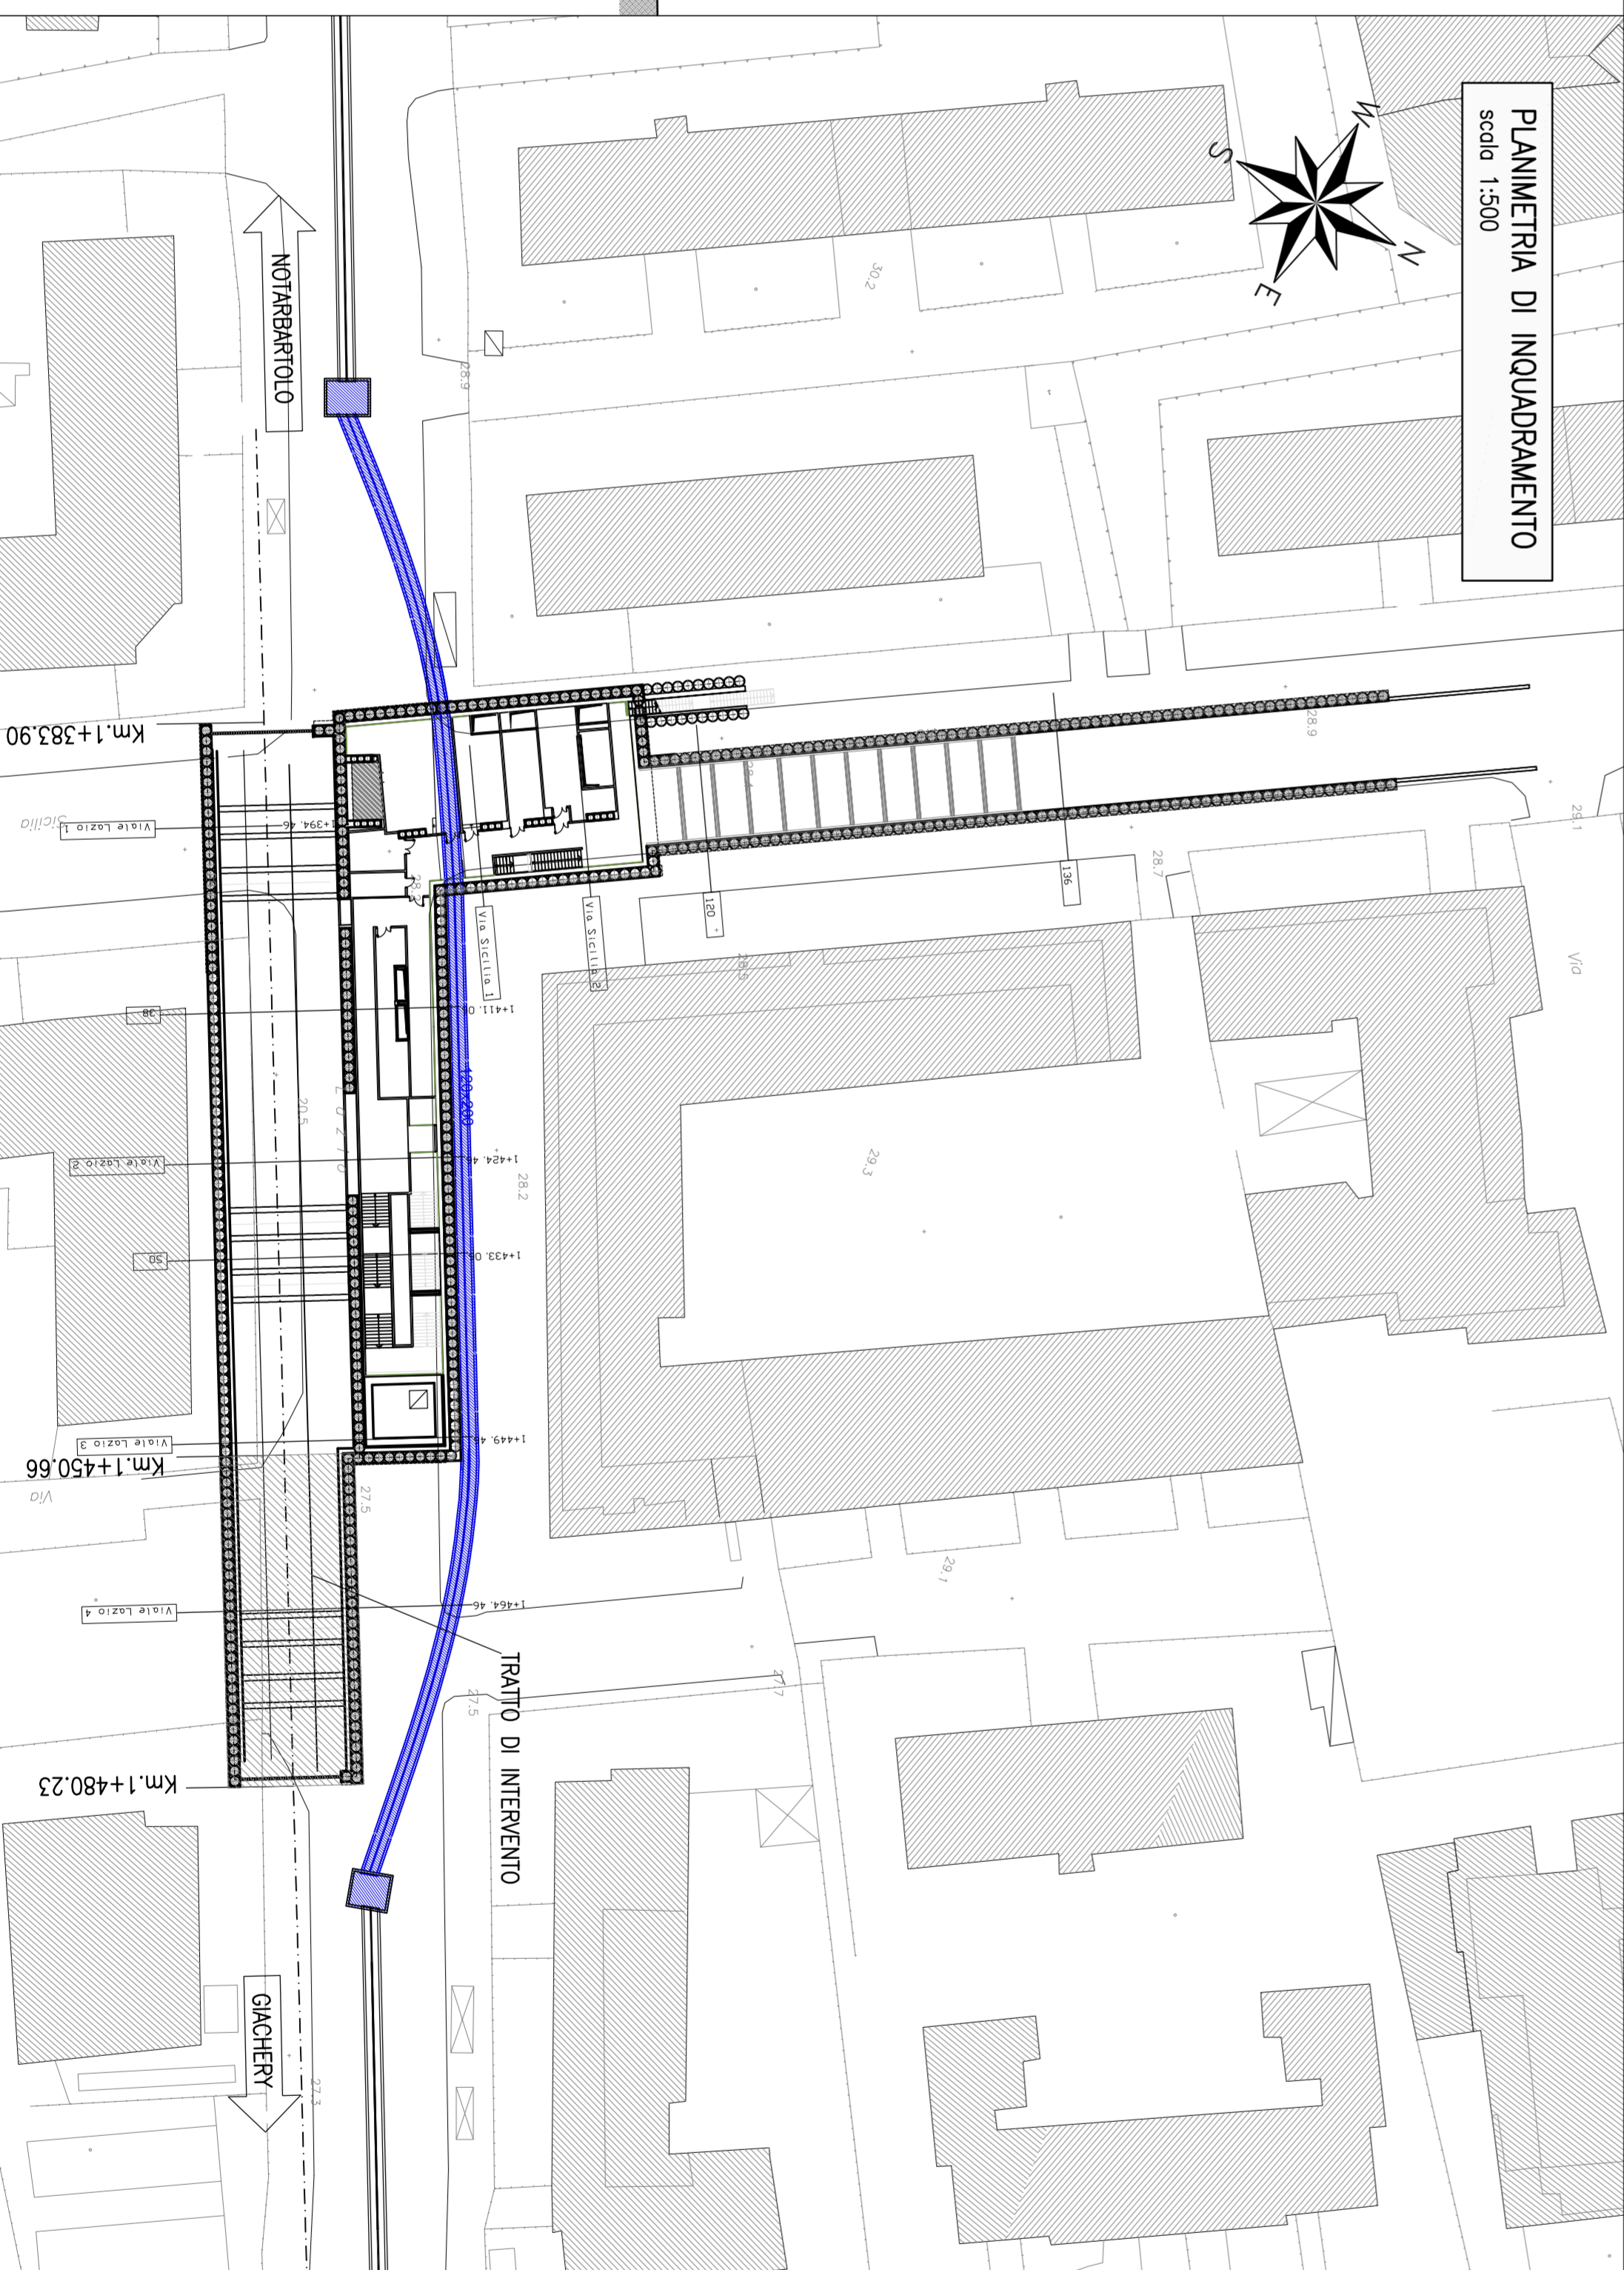

COMUNE DI PALERMO

COMITENTE:



DIREZIONE LAVORI:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOI ARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA STAZIONE LIBERTÀ

FASE COSTRUTTIVE 1/3

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCRIZIONE	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	PZ	GA110X	001	B	VARIE

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	M. Perrino	16.09.10	R. Prud'homme	16.09.10	S. Espinosa	16.09.10
B	Emissione a seguito iterativa lettera	M. Perrino	30.11.11	R. Prud'homme	30.11.11	S. Espinosa	30.11.11

TR0572-01-E-ZZ-PZ-GA110X-001-B
